

Séance N002

Conception &

Elaboration de

projet.

Objectif de la séance

- ✓ Appliquer la démarche de la conception et élaboration de projet;

- Objectif général:
- Au terme de cette intervention, les stagiaires doivent être capables de concevoir et d'élaborer le projet
- Objectifs spécifiques:
- A l'issue de chaque de séquence d'intervention ,les stagiaires seront capables de (d'):
- Appliquer les méthodes et techniques de la conception de projet;
- Décrire la zone et secteur d'intervention;
- Analyser les besoins en élaboration du projet;
- Formuler l'idée du projet;
- Élaborer les termes de référence;
- Elaborer le projet.

- Plan d'intervention
- Introduction ;
- Méthodes et techniques d'identification d'une idée de projet;
- Zone et secteurs d'intervention du projet ;
- Analyse des besoins en élaboration du projet;
- Formulation d'une idée du projet;
- Étude de faisabilité du projet;
- Élaboration des termes de référence;
- Elaboration du schéma de projet.

Introduction

D'entrée de jeux nous voudrions relever la différence qu'existe entre le concept **conception** et **élaboration** de projet qui sont liés de manière continue dans la réalisation d'un projet. Dans la conception de projet on essaie de ressortir le problème que le projet va résoudre.

La conception est en effet considérée comme l'assiette de la vision de l'auteur du projet dans laquelle est inscrite ses méthodes et techniques utilisées pour ressortir l'idée du projet, sa zone et secteurs d'intervention, ses partenaires, ses moyens, la durée, coût et l'envergure du projet.

il s'agit de faire le constat de la situation en mettant un accent particulier sur la population cible, ses problèmes, ses pratiques, sa culture, ses centres d'intérêt et bien d'autres questions nécessaires pour une bonne identification de l'idée du projet.

La participation de l'ensemble des parties prenantes à la conception et la réalisation du projet est la clé de sa réussite et de sa durabilité. Tandis que l'élaboration est la rédaction du document du projet tout en tenant compte de la hiérarchie des étapes de la réalisation du projet.

1. Méthodes et techniques d'identification d'idée de projet

a. méthodes

Il s'agit des procédés qui nous servent à aborder une identification d'une idée de projet.

Il existe deux méthodes qui peuvent nous aider à ressortir une idée de projet :

-les études documentaires ou encore la revue documentaire:


consiste à passer en revue les différents documents de stratégie développement existant dans un pays , des publications de la presse et des organisations tant national qu'international dédiés au développement du pays afin de déduire l'idée d'un projet.

Ex: DSCRP, plan stratégique national de développement

-l'étude environnementale ou l'étude du milieu: il s'agit là d'une analyse des différents besoins ou problèmes que peuvent ressortir une communauté sociale ou administrative.

b. Techniques

Les techniques sont les moyens par lesquels se réalise les différentes méthodes d'identification d'une idée de projet. Chaque méthodologie a ses propres techniques bien distincts.

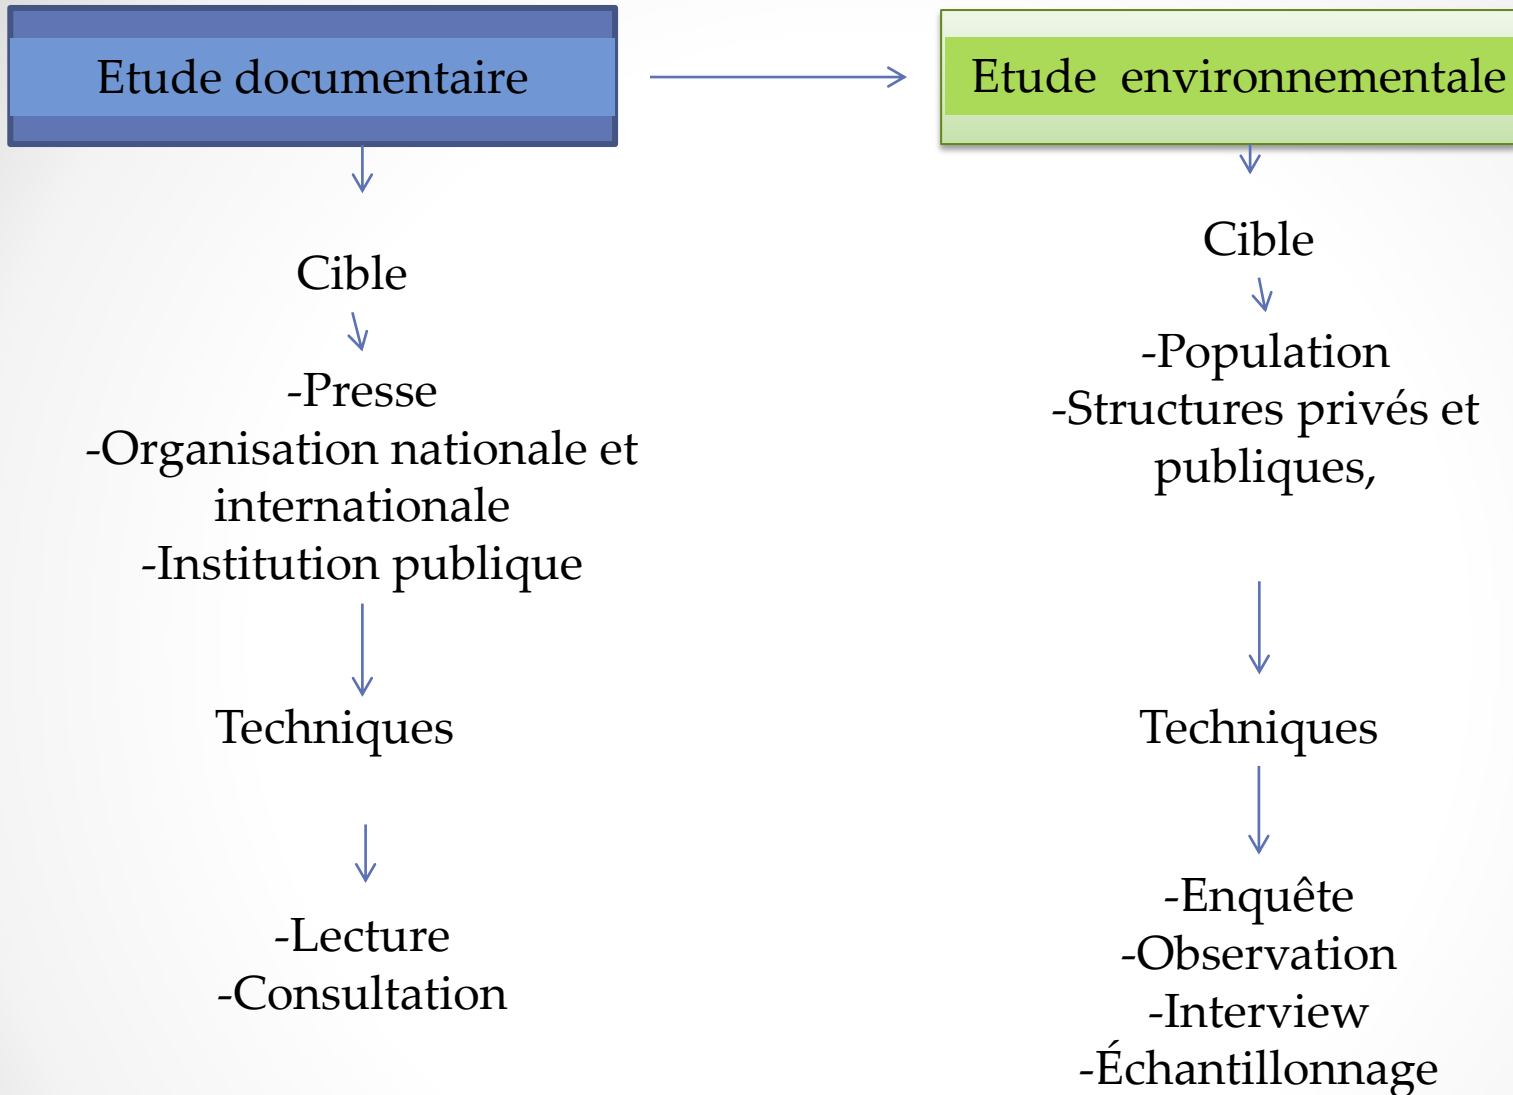

- **Lecture** :elle s'effectue sur le document publié par la presse etc.
- **Consultation**: est une revue des documents annotés dont le contenu porte sur les enjeux de la recherche.
- **Enquête** :est une opération qui a pour but la découverte de faits, auprès de la population cible afin de décrire le problème réel de celle –ci .
- **Observation** : elle nous permet de faire des constats, d'avoir des informations qui paraissent évidentes. Bien que l'observation nous limite aux apparences du problème et non aux véritables causes, elle nous permet néanmoins de faire des hypothèses ou suppositions par rapport au problème.
- **L'interview**: c'est une technique de collecte de données à partir de discussions individuelles et à l'aide d'un questionnaire préparé et testé à l'avance.(Qui? Quoi?, Où?, Quand? ,Comment? ,Combien? ,Pourquoi?) ce concept est appelé aussi the Five W's.

- **Le Focus groupe:** c'est une technique d'informations en présence d'un nombre restreint de personnes(5 à 10). Les travaux sont dirigés par un animateur afin d'assurer la participation de tous les membres et d'orienter les discussions vers le sujet souhaité. Dans ce cas une confrontation des opinions et des idées, permet d'aboutir à une meilleure participation.
- **L'échantillonnage :**L'analyse des besoins se fait avec un échantillon de la population choisie. Les résultats peuvent être généralisés par la suite. Il est important que l'échantillon soit un groupe représentatif, des personnes avec lesquelles nous allons travailler.

2. Zone et secteurs d'interventions

a. Zone : elle est un espace géographiquement déterminé par le porteur du projet sur base de certaines considérations objectives inhérentes au projet.

Ex : la zone d'intervention de pakadjuma, etc.

b. Secteur : c'est le domaine dans lequel s'inscrit l'intervention proposée comme solution à la cible.

EX: éducation , santé, environnement, etc...

3. Analyse des besoins en élaboration du projet

- elle consiste à identifier les liens de causalités (un projet ne s'attaque pas aux effets mais aux causes). Pourquoi faire une analyse des besoins?
- L'analyse des besoins vise à découvrir ce que les gens veulent et ce dont ils ont besoin. Elle aide aussi à comprendre leurs opinions et leurs attitudes.
- En réunissant les déclarations de la population, vous allez découvrir un grand nombre de problèmes ou de besoins. certains ne vont pas être exprimés par la population, d'autres encore ne seront pas bien identifiés.
- Quatre types de besoins sont connus, nous pourrons les prendre en considération lors de l'analyse des besoins:

- a. **Les besoins ressentis:** ce sont les besoins qui ne sont exprimés par la population que lorsqu'on lui demande ses opinions.
- b. **Les besoins comparatifs:** c'est le manque de services ou d'un état de bien être chez une population en comparaison avec une autre population (un village voisin par exemple)
- c. **Les besoins normatifs:** ce sont des besoins qui sont déterminés par des acteurs qui connaissent la population et/ou qui disposent d'une expérience.

4. Formulation d'une idée du projet;

Une fois les problèmes prioritaires de tous les groupes de la communauté identifiés, on organise une réunion pour toute la communauté afin d'aller plus loin dans l'analyse. Cet outil permet d'approfondir les causes à l'origine des problèmes et les stratégies mises en œuvre en cas de crise. Il est important d'explorer ces stratégies d'affrontement car certaines d'entre elles pourraient être mises en œuvre en cas de crise. Il est important d'explorer ces stratégies d'affrontement car certaines d'entre elles pourraient être mises à profit dans les actions de développement.

L'outil est également utile pour savoir ce qui a déjà été tenté pour résoudre certains problèmes, ainsi que les résultats obtenus. Par ailleurs, la grille d'analyse des problèmes permet d'envisager les potentialités de développement.

Aussi, il convient d'inviter des experts techniques provenant d'organismes extérieurs (agents de vulgarisation, ONG) qui pourraient être mieux informés au sujet des options existant en matière de développement. En effet, à ce stade, les bonnes idées des populations locales ne suffisent plus et il faut que toutes les informations pertinentes soient mises à profit afin que les populations prennent des décisions en connaissance de cause.

- Exemple
- La grille d'analyse des problèmes produite par les habitants du village de Domiongo, dans le territoire de Mweka fait état de 11 problèmes importants, accompagnés de leurs causes, stratégies d'affrontement et options de développement

Problème	Causes	Stratégie d'affrontement	Solution possibles
Santé et assainissement	Rareté de l'eau ; assainissement des eaux insuffisant; inexistence de latrines ; eaux usées , manque d'installations sanitaires, malnutrition ; accumulation des déchets, exposition aux vents-pluies-soleil, logements de mauvaise qualité.	Médecine traditionnelle Guérisseurs clôtures	Fourniture de services médicaux Vaccination Médecine curative et préventive
Santé animale	Sécheresses; excès de cheptel; endoparasites; bactéries ; virus.	Immersion des animaux ; Guérisseurs Détiquer à la main Brûler Médicaments	Bassin de trempage Fourniture de médicaments vétérinaires Rémèdes

Érosion	Inondations(érosion ravivant et en couche);excès de cheptel ; déboisement	Aucune pour le moment	Augmentation du couvert végétal par des plantations d'arbres et d'herbe Contrôle des barrages Petite dérivation Digues.
Eau	Manque de canalisations d'eau , Manque d'entretien des conduites ; Manque de diesel ; sécheresses	Points d'eau éloignés Contributions financières pour entretien migrations vers l'eau; réservoirs d'eau	Canalisations d'eau Diesel pour la pompe Construction d'un réservoir d'eau
Sécheresse	Position géographique ; faibles pluies ; intensité des pluies quand elles arrivent; pluies irrégulières : déboisement	Aucune pour le moment	Gamme de discipline Protection de l'environnement

Energie	Manque de fourneaux pour cuisiner ; manque de pétrole ;coût de pétrole	Bois de feu Diesel pour lampes	Introduction de fourneaux pour cuisiner Kérosène moins coûteux.
Chômage et faibles revenus	Absence de politiques gouvernementales , faible activité économique ;manque de qualifications; isolement du village	Dépendance de la famille emplois invisible	Programmes de création de revenus Formation professionnelle Route accessible toute l'année vers villes principales
Femmes chefs de ménage	Décès du conjoint soutien de famille ;divorce émigration du conjoint pour motifs de travail	Travail hors du foyer Gestion du ménage Travail des enfants Mariage précoce.	Activités créatrices de revenus Machine à coudre Formation professionnelle

Marché et commercialisation	Connaissances insuffisantes marchés local et international ; transports insuffisants; mauvaise situation du village ; inexistence circuits commerciaux ; sous-population.	Système de troc pour les transactions Petites entreprises	Création d'une organisation commerciale Amélioration du réseau de transport Amélioration des marchés et commercialisation
Habitat	Personnes déplacées par la guerre civile; mauvais conditions habitat dues aux restrictions financières	Vie avec la famille ou groupes apparentés Travaux de ménage réguliers des femmes.	Construire des logements à bas coût Loyers bas et logement à bas coût.

- **Étapes dans l'utilisation de l'outil**

1. Une réunion avec toute la communauté est organisée. Choisissez un jour et une heure convenant à tout le monde de la communauté soient représentées.
2. Au moins deux ou trois experts techniques issus d'organismes extérieurs seront également présents. Ces experts devront avoir des compétences en rapport direct avec les problèmes identifiés par les membres de la communauté.
3. La réunion débutera par une brève présentation des résultats de tous les exercices réalisés, obtenus grâce à l'analyse du contexte de développement, des moyens d'existence et des problèmes prioritaires (et leurs causes et effets) des différentes catégories socioéconomiques à hommes et femmes. De cette façon, la communauté aura une idée globale de la situation. La présentation permettra également d'informer les experts techniques.
4. Pour la présentation des résultats, on utilisera le matériel produit par les participants (cartes, diagrammes, tableaux, matrices, etc.) qui pourra être affiché ou exposé dans la salle de réunion.

5. Quelques personnes ayant participé aux exercices pourraient être chargées de répondre aux éventuelles questions posées par les "visiteurs" qui circuleront dans la salle. On devra prévoir au moins deux heures pour cette séance, en fonction de la taille de la communauté.
6. Une grille d'analyse des problèmes est ensuite préparée, en indiquant dans la colonne de gauche les trois problèmes prioritaires identifiés dans le classement par paire par chacun des groupes. Si le même problème a été identifié par plus d'un groupe, il n'apparaîtra qu'une seule fois dans la grille. Dans la seconde colonne sont indiquées les causes du problème (mises en évidence dans le schéma des causes et des effets).
7. La grille d'analyse des problèmes doit être bien visible. On explique tout au long de la présentation quels groupes ont identifié les différents problèmes et on fait ressortir les priorités communes. Les causes identifiées sont également exposées. Les participants, experts y compris, sont invités à faire des commentaires.
8. Les participants sont ensuite invités à expliquer comment ils font habituellement face aux différents problèmes. Les stratégies d'affrontement sont inscrites dans la troisième colonne.
9. En conclusion, la communauté et les experts extérieurs sont invités à discuter les solutions possibles de développement pour chaque problème et à apporter des idées. Les solutions identifiées dans le schéma des causes et des effets peuvent être exploitées. Les solutions sont inscrites dans la quatrième colonne.

- **Les éléments constitutifs d'un titre de projet:**

- la solution possible

- la cible

- la zone d'intervention

- la période d'exécution du projet.

PS: la mention de la période d'exécution n'est pas obligatoire.

Problème	Causes	Stratégie d'affrontement	Solution possibles

5. Etude de faisabilité

L'étude de faisabilité est une démarche de vérification technique, socio-économique, financière et légale afin de ressortir les résolutions qui qui s'attache à vérifier que le projet soit techniquement faisable et économiquement viable.

Dans une optique plus large, on distingue les volets suivants dans une étude de faisabilité: étude technique ,socio-économique, légale etc.

Il y a 3 raisons principales pour lesquelles nous menons une étude de faisabilité :

- la sélective*: sélectionner un projet avec un haut niveau de possibilité de succès et avec une signification plus stratégique pour l'organisation ;

-la prédiction: fournir certaines prévisions pour les tendances du développement du projet et les résultats futurs et donner un soutien à la hiérarchie et aux décideurs;

-la prévention : éviter un projet avec une qualité inférieure et pauvre soubassement, donc éviter l'erreur ou les risques des pauvres investissements

L'étude de faisabilité vise plusieurs aspects notamment:

Faisabilité technique: c'est une analyse des ressources techniques dont :-ressource en exploitation ;-ressource en réalisation.

a. Ressources en exploitation: il s'agit d'une évaluation générale de besoins structurels commis à la planification et coordination de l'investissement notamment :

- Les locaux commerciaux
- Les compétences requises
- Le mobilier
- Impôt et taxe
- Autres charges(facture eau, électricité etc.)

b. Ressources en investissement : il

déterminer les besoins en moyens physiques (bâtiments, locaux, bureaux, mobiliers, terrains, équipements, compétences etc. faut il louer ou acheter? Il faut évaluer à quel degré les solutions proposées marcheront et si les personnes et tout autre instrument travailleront pour exécuter la solution.

Est-ce que cela marchera efficacement et dans la stabilité?

PS: les aspects techniques contrôlent l'analyse du risque, la planification de capacité et la performance.

- **Faisabilité socio-économique:** il faut une évaluation des coûts, des avantages des différentes solutions pour sélectionner les aspects qui offrent la meilleure valeur. considérer la valeur économique au niveau national: le nombre d'emploi qui seront créer ; qualité du travail ,quel types des contrats? CDD ou CDI? Est-ce que le système coutera les bénéfices attendus? Est-ce les coût surpasseront-ils l'impact?

❖ **Faisabilité financière:** consiste à étudier le mode de financement.

- Un projet peut être financé de 3 manières:
- Fond propre: partage de dividende;
- Emprunt: taux d'intérêt et de remboursement;
- Subvention: non remboursable.

- Les indicateurs financiers qui permettent de voir si un projet va réussir exemple:
- VAN: représente le surplus des bénéfices après avoir effectué toutes les dépenses.
- Tout projet à VAN(-) est rejeté
- Les projet dont la VAN =0 sont dites projets des développements.
- Les projets(+) sont ceux qui sont acceptés.

- Le résultat de l'étude de faisabilité alors il peut y avoir 3 résultats après étude de faisabilité:
- -le projet peut être annulé;
- -Suspendu, ou ;
- -approuvé.
- Chaque étude de faisabilité débouche sur un document unique contenant:
- Une méthodologie;
- Une série des recommandations sur les options à exécuter.

6. Élaboration de termes de références

Il s'agit d'un canevas d'exécution de projet décrivant de manière hiérarchique le bilan du départ du projet , une sorte de vadémécum ,mieux un guide permettant aux parties d'avoir la même perception du projet quant à sa description, ses jalons, ses contraintes et suppositions, ses critères d'acceptations et ses parties-prenantes.

N°	Titre :
I. <u>Description de projet</u> A)but: raison pour laquelle le projet a été monté ,la population cible. b)Objectifs: -Objectif général: écrit sous-forme d'un énoncé général Il s'agit de l'objectif global auquel le projet est censé contribuer. Il doit être compatible avec les stratégies nationales de conservation existantes -objectifs spécifiques: ou encore effet, c'est que le projet va réaliser dans l'immédiat et doit être SMART	
II. <u>jalons:</u> bornes sont des événements clés d'un projet ,montrant une certaine progression du projet les étapes significatives dans l'exécution du projet.	
III. <u>Contraintes et suppositions:</u> les différents risques qui peuvent surgir au cas où telle ou telle autre condition n'est pas réunie	
IV. <u>Critères d'acceptation</u> :sont les éléments de bases qui ont besoin d'être démontrés ou finalisés pour que le commanditaire accepte officiellement l'application	
V. <u>Partie-prenante:</u> il s'agit de l'ensemble des personnes et des organisations qui ont quelque chose à avoir avec le projet.	

7. Elaboration du schéma de projet

Se lancer dans un projet ,c'est opter pour l'action en vue d'un changement contrôlé dans le temps.

La méthode du projet est le cadre dans lequel le rêve peut prendre forme et devenir réalité.

Il existe différents modèles de projet qui reflètent des définitions et des développements différents au niveau de la méthodologie.

Chaque modèle est aussi adapté à certains facteurs : contexte; groupe cible, ressources disponibles. Néanmoins, tous les projets suivent un schéma similaire.

- L'élaboration de tout projet doit être normalement concise et claire pour éviter toute sorte de confusion possible entre ses différentes articulations les unes des autres.
- Le mode classique exige le respect du schéma suivant pour élaborer correctement un projet:

- I. Contexte et justification de projet;
- II. Objectifs;
- III. Bénéficiaires;
- IV. Activités;
- V. résultats;
- VI. Budget indicatif et;
- VII. Chronogramme des activités à réaliser.

Ces différentes parties se distinguent les unes des autres et dans la rédaction , chacune d'elles a ses propres exigences et renseigne sans ombrage ce à quoi s'intéresse le projet dans son exécution.

- Ne pas être attentif lors de la rédaction d'un projet, quelle que soit sa taille, entraîne facilement la confusion entre certaines parties et floue d'une manière générale le reste du travail rédactionnel en rendant sa compréhension difficile, voire impossible.
- Dans la pratique néanmoins, les formes de l'élaboration varient selon les exigences de chaque bailleur.

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Elle constitue la partie par laquelle la rédaction d'un projet débute , hormis le cas où , le bailleur en demande le contraire.

A. CONTEXTE: OÙ (WHERE)

(Contexte social du projet et situation des participants)

Cette partie consiste à localiser le projet et le classifier , c'est-à-dire fournir les renseignements géographiques du milieu où le projet doit être exécuté(zone),et le domaine dans lequel il se réalise(secteur) Elle décrit aussi les différents modes de mobilité au lieu de l'exécution du projet.

Dans une certaine mesure ,il est également utile de renseigner sur la situation socio-économique des occupants du milieu où l'on veut exécuter le projet en déterminant la nature d'activités principales auxquelles s'applique la majorité de la population (agriculture, pêche, commerce,...),une population moyennement pauvre , riche,...

Somme toute, dans cette partie , l'on doit répondre avec précision aux questions suivantes:

- Quelle est l'origine du projet (à partir de considérations sociale , économique , culturelle ,politique , historique ,géographique,...);
- Quel est le problème à résoudre?
- Quelle est la position de l'organisation et celles des autorités locales par rapport à ce problème?
- Quelles sont les actions déjà effectuées dans ce domaine?

B. JUSTIFICATION.

(Besoins et aspirations auxquels le projet répond.
Motivation et intérêts des acteurs.)

Cette partie est l'une des parties les plus sensibles et très nécessaire de toute élaboration de projet. En principe, un projet sans justification n'a pas droit d'être financé. C'est à dire une démarche sans **solution** exacte.

C'est ici que vous devez ,montrer avec précision le mobile de votre volonté d'intervention, c'est-à-dire vous devez soulever d'une manière assez claire le problème ou le besoin auquel vous souhaitez apporter **les réponses** attendues par tous. Vous devez donc , à ce stade , **éviter de parler de plus d'un problème à la fois.**

- Certes, lors de l'évaluation générale du milieu (monitoring) faite par l'équipe d'enquête sur terrain ,les problèmes rencontrés et soulevés par la population locale sont multiples. Le document de la rédaction d'un projet doit être **spécifique** et ne cadrer qu'avec **un besoin bien orienté**. Il faut éviter de faire le cumule, chaque projet constitue un cas particulier.
- En somme, il faut y **aller cas par cas et vouloir analyser et résoudre les problèmes les uns après les autres en fournissant les réponses satisfaisantes aux questions ci-après:**

- ❖ Pourquoi le projet est nécessaire?
 - ❖ Pourquoi le moment semble opportun ?
 - ❖ Quel sera l'effet du projet une fois réalisé?
 - ❖ Quel est le bénéfice que la population locale peut tirer du projet ?
 - ❖ Quel est l'intérêt des autorités locales ?
 - ❖ Quel peut être l'intérêt de l'organisation de financement?
- note: en voulant résoudre deux ou trois problèmes à la fois, vous vous fragilisez d 'avantage. D'abord vous flouez totalement l'esprit du bailleur qui enfin ne vous comprendra plus. Ensuite, vous ne réuniriez pas les moyens requis pour satisfaire à tous les besoins au même moment. Enfin , vous apporteriez de réponses inadaptées ou superficielles à certains des problèmes car la tâche à réaliser sera assez large.

II. OBJECTIFS Le mot objectif signifie but que l'on se propose d'atteindre en menant une action.

- Il sied, d'ores et déjà, de mentionner que tout projet doit avoir un but pour lequel il est conçu, élaboré, financé et exécuté. Lorsque le but n'est pas clairement défini, le projet doit être mal géré et son impact ne sera pas bien remarqué sur le terrain.
- Dans l'élaboration d'un projet, les objectifs sont toujours classés en deux grandes catégories: objectif général et objectifs spécifiques.

- **A.OBJECTIF GÉNÉRAL OU DE DÉVELOPPEMENT**
- Il s'agit de l'objectif global auquel le projet est censé contribuer. Il doit être compatible avec les stratégies nationales de conservation existantes ou toute autre stratégie de développement officielle. Par définition ,cet objectif est large et ne sera pas atteint par le seul travail du projet.
- Il montre , sans vraiment entrer en détail ,le but primordial pour lequel un projet doit être exécuté.
- De fois , certains projets ,selon leurs envergures , peuvent poursuivre deux ou trois objectifs généraux. La plupart de petits projets n'ont qu'un seul objectif général qui les caractérise. Cet objectif doit ressortir dans la rédaction d'une manière nette et claire.

❖ B. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES(OBJECTIFS IMMÉDIATS , OBJECTIFS DU PROJET)

- Il s'agit de ce que le projet est censé réaliser.
- **Attention** : ne pas confondre l'objectif immédiat du projet avec ses résultats ou ses activités. Si vous avez trop d'objectifs de projet, le projet risque d'être ambigu et difficile à réaliser.
- Ils ne sont pas à confondre avec les activités à matérialiser lors de la gestion d'un projet. L'exécution d'un projet poursuit normalement plusieurs buts particuliers qui justifient même l'essence de tout financement.
- Quand vous rédigez cette partie , restez entièrement vigilant car chaque objectif doit non seulement être concis , mais aussi se démarquer des autres. Aucun d'eux ne doit se confondre à un autre. Lorsque deux se rapprochent, il faut supprimer un ou les fusionner afin qu'ils donnent un seul.

- Tous les objectifs spécifiques retenus doivent être mesurables et réalisables.
- Dans le cas contraire , l'on rend la tâche de l'évaluation difficile et l'on court le risque de se gaspiller énormément tant en fonds qu'en énergie pour un résultat maigre.

III. BÉNÉFICIAIRES (groupe cible)

C'est l'ensemble de personnes pour lesquelles le projet est exécuté. Ils sont appelés bénéficiaires parce qu'on leur donne un bien ou un service gratuitement ou en contre partie d'un effort relativement léger qu'ils apportent en vue de la concrétisation de tel service ou tel bien réalisé dans le milieu où ils vivent.

Ils sont classés en deux grandes catégories qui marquent leur distinction claire. Les deux catégories sont notamment les **bénéficiaires directs et ceux indirects**.

a. bénéficiaires directs:

Ils constituent la catégorie de tous ceux qui sont directement ciblés par la réalisation du projet.

Il peut s'agir soit des femmes, hommes ,jeunes garçons, jeunes filles , enfants , vieillards et de fois tous à la fois.

- En outre, les exigences de tout projet imposent que le nombre exact de bénéficiaires directs soit toujours fourni avec précision. Ils doivent être bien identifiés et bien quantifiés. D'où , nécessité d'une enquête préalable portant non seulement sur les problèmes de la communauté, mais aussi sur les bénéficiaires enfin d'en dégager un nombre clair.
- Il ressort donc, aux termes de ce qui précède que le projet ne peut être exécuté sans la présence effective de la catégorie de bénéficiaires directs. Le projet est , en somme, élaboré pour eux et est géré en leur faveur. Ils méritent, à cet effet , une attention singulière durant toute la période de l'exécution des actions les unes après les autres.

- **B. bénéficiaires indirects**

C'est la grande classe de ceux qui ne sont pas directement concernés par le projet, mais qui jouissent de ses effets d'une manière ou d'une autre. Le projet n'est pas exécuté, en principe, pour eux. Cependant, au regard de leur proximité avec les bénéficiaires directs, l'on ne peut pas leur interdire de bénéficier des actions menées.

Il est souvent difficile, voire impossible de dégager avec précision leur effectif d'autant plus qu'ils sont régulièrement en grand nombre. On y compte les membres de familles restreintes de bénéficiaires directs, ceux de leurs familles élargies, les voisins du lieu où le projet exécuté, les visiteurs, les passants,...

- Néanmoins , même si l'on se retrouve dans l'impossibilité de dégager leur effectif exact , une situation contraire à la première catégorie, il est toujours nécessaire de fournir un chiffre (estimation) approximatif dans le but de respecter les exigences de la meilleure forme de l'élaboration.

V. Activités

Les principales activités spontanées ou organisées. travail qui doit être accompli pour atteindre les résultats escomptés. Les activités peuvent être nombreuses mais doivent absolument être réalistes et être associées aux ressources et aux couts.

Chaque activité devrait également être associées aux ressources et aux coûts.

NB: Chaque activité devrait également être associée à un résultat. Une activité commence toujours par un verbe: acheter ,engager, appliquer , faire , visiter ,distribuer , former, etc...

- les activités d'un projet ne sont pas à confondre avec les objectifs spécifiques de celui-ci. Les objectifs spécifiques rappelons-le, sont de buts particuliers à atteindre lors de la gestion d'un projet. Les activités sont les actions.
- À ce stade, nous estimons utile de rappeler la définition du mot projet avant d'éclaircir la notion des activités. En effet par le terme projet ,nous l'avons déjà dit , on attend « un ensemble d'actions à réaliser avec des ressources données ,pour satisfaire à un objectif défini, dans le cadre d'une mission précise, et pour la réalisation desquelles on a identifié non seulement un début ,mais aussi une fin.

- Au termes de cette définition ,le mot action joue un rôle moteur de tout projet.
- Les actions d'un projet constituent donc les voies par lesquelles il faut passer pour atteindre les objectifs spécifiques.
- Par activités d'un projet il faut attendre les différentes actions posées ou exécutées les unes après les autres en faveur de la catégorie ciblée.
- Chaque activité doit faire objet d'un calcul du coût et de temps (durée) et doit être clairement mesurable.

- Un projet peut avoir plusieurs activités à réaliser à la fois. Cependant il est utile de maîtriser celle par laquelle il faut débiter le projet. Bien des projets commencent souvent par la formation ou le renforcement de capacités du personnel recruté pour la gestion, puis vient la sensibilisation des autorités locales et de la population du lieu où le projet doit être exécuté et enfin viennent les autres activités essentiellement techniques.

- Chaque projet faisant objet d'une analyse particulière, génère donc des activités particulières en ce qui le concerne . Les activités du projet S ne sont pas celles du projet T.

. RÉSULTATS.

Il importe de mentionner que le projet étant un ensemble d'actions se succédant les unes après les autres ,chacune d'elles chute sur une conséquence adéquate ou fruit appelée résultat.

Ces résultats doivent ,chacun correspondre à une activité précise. Ils sont la conclusion des activités menées . Seulement il ne faut jamais les analyser dans la globalité car chacun est le reflet d'une activité bien déterminée.

- NB: aucun résultat ne sera présenté d'une manière brute. Chacun doit être spécifique ,mesurable ,atteignable , réalisable et temporaire :SMART dans le cas contraire le travail se complique et l'évaluation perdra son caractère objectif.

VI. BUDGET INDICATIF

Par budget , il faut entendre « un état prévisionnel et contrôlé de dépenses et recettes, généralement relatif à une année. »

Dans le contexte de projets, le budget s'article autour de trois axes principaux à savoir : l'axe matériel ,l'axe ressource humaine et l'axe frais de fonctionnement.

A. Ressources matérielles

C'est l'ensemble de l'équipement durable et consommable dont le projet a besoin pour être bien géré. L'acquisition de ce matériel nécessite au préalable une étude budgétaire appropriée c'est-à-dire l'on mène des analyses de nature à orienter le montant que l'on doit mobiliser pour faciliter l'achat de tout le matériel dont on a besoin .

L'on spécifie donc les éléments sans lesquels les activités ne se réaliseront pas et on détermine le prix soit unitaire et total ensuite; soit le coût global seulement. Tout dépend des exigences de bailleurs.

B. Ressources humaines:

La réalisation des actions d'un projet nécessite toujours la présence d'un personnel dont la prestation est rémunérée.

Lors de la rédaction d'un projet , il faut préciser avec exactitude le nombre du personnel que l'exécution du projet exige pour être bien géré. Préciser le statuts de chacun si besoin et déterminer le solde de chacun par mois. Le nombre du personnel varie d'un projet à un autre. Il peut être assez grand ici et assez rétréci là. Tout dépend donc de la taille du projet à exécuter.

On en distingue deux catégories à savoir:

Personnel programme:

Est celui qui est commis à l'exécution du projet de manière permanente et a une obligation de résultat.

Personnel d'appuis:

Est celui qui est commis pour les tâches ponctuelles du projet et dont , la rémunération est payée par service rendu, et ce, de manière négociée.

NB: éviter d'engager une main d'œuvre abondante lorsque le budget est maigre et n'allez jamais au-delà de 30% du budget total rien que pour la ligne salariale.

- **C. Frais de fonctionnement**
- C'est une ligne qui reprend toutes les dépenses annexes et celles non retrouvées dans la ressource matérielle et là dans la paie du personnel.
- Le frais de fonctionnement comprennent les dépenses relatives aux loyers , à la communication , aux différentes missions des agents , paiement de factures des énergies consommées: S.N.E.L et REGIDESO,...
- Le taux de ces frais varie entre 07 et 15% chez la plupart de bailleurs de fonds. Cependant , dans la pratique , le frais de fonctionnement de petits projets dépassent facilement 15% en vue de permettre ceux-ci à être bien géré.

À mobiliser (\$)	Source de financement		Matériels ou matériaux	unité	P.U(\$)	P. T (\$)	Affectation	périod
10,000	Fond propre	bailleurs	Sac de Ciment	10	7	70	maçonnerie	3sém du p
		Nommontant						

VII. Chronogramme d'activités

Le chronogramme est un concept utilisé dans plusieurs pays pour désigner les horaires de travail ou des activités. Le terme provient des mots grecs chronos (« temps ») et grammar (« lettre »).

Le chronogramme est donc un outil assez important dans la gestion des projets. Il peut s'agir d'un document en papier ou d'une application numérique; en tout cas, le chronogramme comprend une liste d'activités ou de tâches avec des dates de début et de fin.

Exemple d'un projet de promotion socio-professionnelle des enfants handicapés.

N ₀	Période	Activités	Lieux	Cibles
	20/05-05/06/2019	Equiper les locaux en matériel pédagogique adapté	St Georges kintambo	
	20/05-05/06/2019	Elaborer les programmes De formation	Ministère Epsp	
	20/05-05/06/2019	Réaliser les inscriptions Des enfants	St Georges	
	20/05-05/06/2019	Réaliser la session d'alphabétisation fonctionnelle	St Georges	
	20/05-05/06/2019	Réaliser les stages de formation en ménuserie,couture, Coiffure et calligraphie	St Georges	
	20/05-05/06/2019	Suivi et accompagnement de jeunes dans la recherche d'emploi	St Georges	
	20/05-05/06/2019	Evaluation du projet	St Georges	

Le cadre logique

Le cadre logique est un outil de conception et de conduite de projet. A ce titre, il incorpore un dispositif de suivi et évaluation.

Le cadre logique est une méthode de gestion axée sur les résultats(GAR) il permet de confronter , déjà sur le papier , la cohérence entre les différents niveaux de projets, en prenant comme point de référence son objectif les plus élevés.

Développé en 1969 par le cabinet practical concept pour la coopération américaine (USAID), le cadre logique a été repris depuis par la quasi-totalité des organisations de développement (europeAid ,GIZ ,DFID ,DANIDA , jica ,AFD,AusAID;)

- Il synthétise sous forme de tableau(une matrice)toutes les informations clés d'un projet:
- Objectifs , résultats ,activités, risques et ressources.
- Le cadre logique va permettre de répondre aux questions suivantes:
- Quel est le but du projet?
- Quelles activités vont être menées pour atteindre ce but?
- Quelles sont les ressources nécessaires ?
- Quels risques pourraient affecter la mise en œuvre du projet?
- Comment sera mesuré l'évolution des activités et l'atteinte des objectifs?

Logique d'intervention	Indicateur objectivement vérifiable	Sources de vérification	hypothèses
Objectif global			
Objectif spécifiques			
Résultats			
activités	Moyens	coûts	

1^{ère} colonne

La logique d'intervention
 Chaque niveau doit permettre d'atteindre le niveau supérieur.
 Pour les objectifs et résultats, la formulation décrit la situation souhaitée, l'état à atteindre sous forme d'un verbe conjugué.
 Exemple : les jeunes créateurs d'entreprise ont accès au crédit.
 Pour les activités, on choisira un verbe à l'infinitif, un verbe d'action

2^{ème} colonne

Les indicateurs objectivement vérifiables
 Facteurs ou variables, de nature quantitatives ou qualitatives, qui constituent un moyen simple et fiable de mesurer et d'informer des changements liés à l'intervention ou d'aider à apprécier la performance d'un acteur de développement.
 (SMART)

3^{ème} colonne

Sources de vérification :
 Quelles sont les sources d'information? d'où sont issues les données qui vont permettre de mesurer et déterminer les indicateurs de la deuxième colonne?

4^{ème} colonne

Hypothèses:

Facteurs externes qui , à
chaque niveau de la
première colonne peuvent
influencer l'évolution du
projet

Gestion par les risques :quels
sont les risques sur lesquels le
projet n'a pas prise et qui
pourraient affecter l'atteinte
des objectifs, des résultats, la
mise en œuvre des activités?
